


農山漁村地域整備計画に係る事後評価

計画の名称								
阿曾浦漁港漁村整備計画								
計画策定主体								
三重県、南伊勢								
対象市町村								
南伊勢町								
計画の期間								
平成25年度 ～ 平成26年度（2年間）								
交付対象事業の進捗状況事業								
								総事業費 単位：千円
事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内 の事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内 の総事業費	備考
水産基盤整備事業								
	漁村再生交付金事業	阿曾浦	南伊勢町	南伊勢町	緑地・広場施設整備 A=2,330m ²	H25～ H26	30,000	
合計 (全体事業費)							30,000	
事業効果の発現状況								
<p>集落道を整備したことにより、緊急車両の進入が可能となり地域住民の安心を確保する事ができた。また、集落近辺は、地形的制限により憩いの場所がない状況であったが、地域住民の交流及び休息ができる緑地・公園施設を整備したことにより、子供たちの遊び場、老人たちの休息の場、親子のふれあいの場として活用しています。</p>								
定量的指標の達成状況								
成果目標	目標値	実績値		達成率				
集落環境施設整備により緑地・公園への移動時間の短縮	現行30分を4分に短縮	4分に短縮		100%				
今後の方針								
施設の機能を維持するために点検を実施し、施設の長寿命化やライフサイクルコストの低減を図る。								

着工前

1

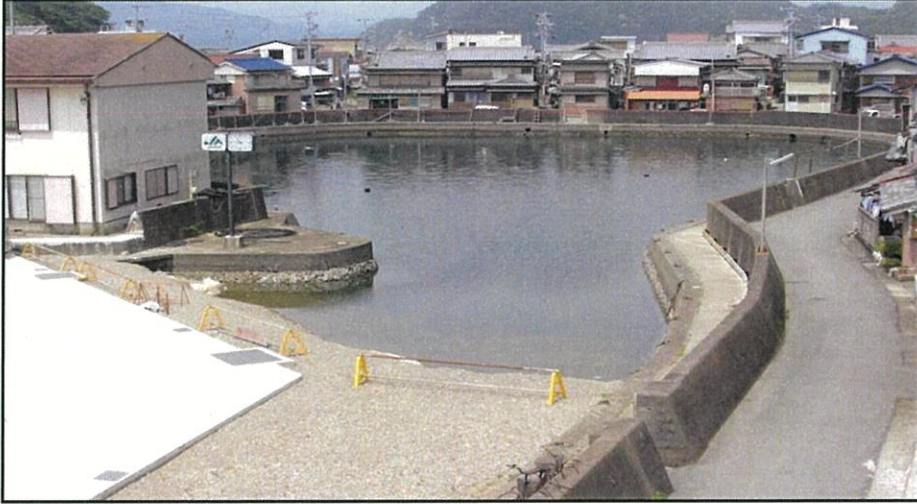

完成

1



着工前

2



完成

2



着工前

3



完成

3



4

着工前



4

完成



5


完成



6

完成



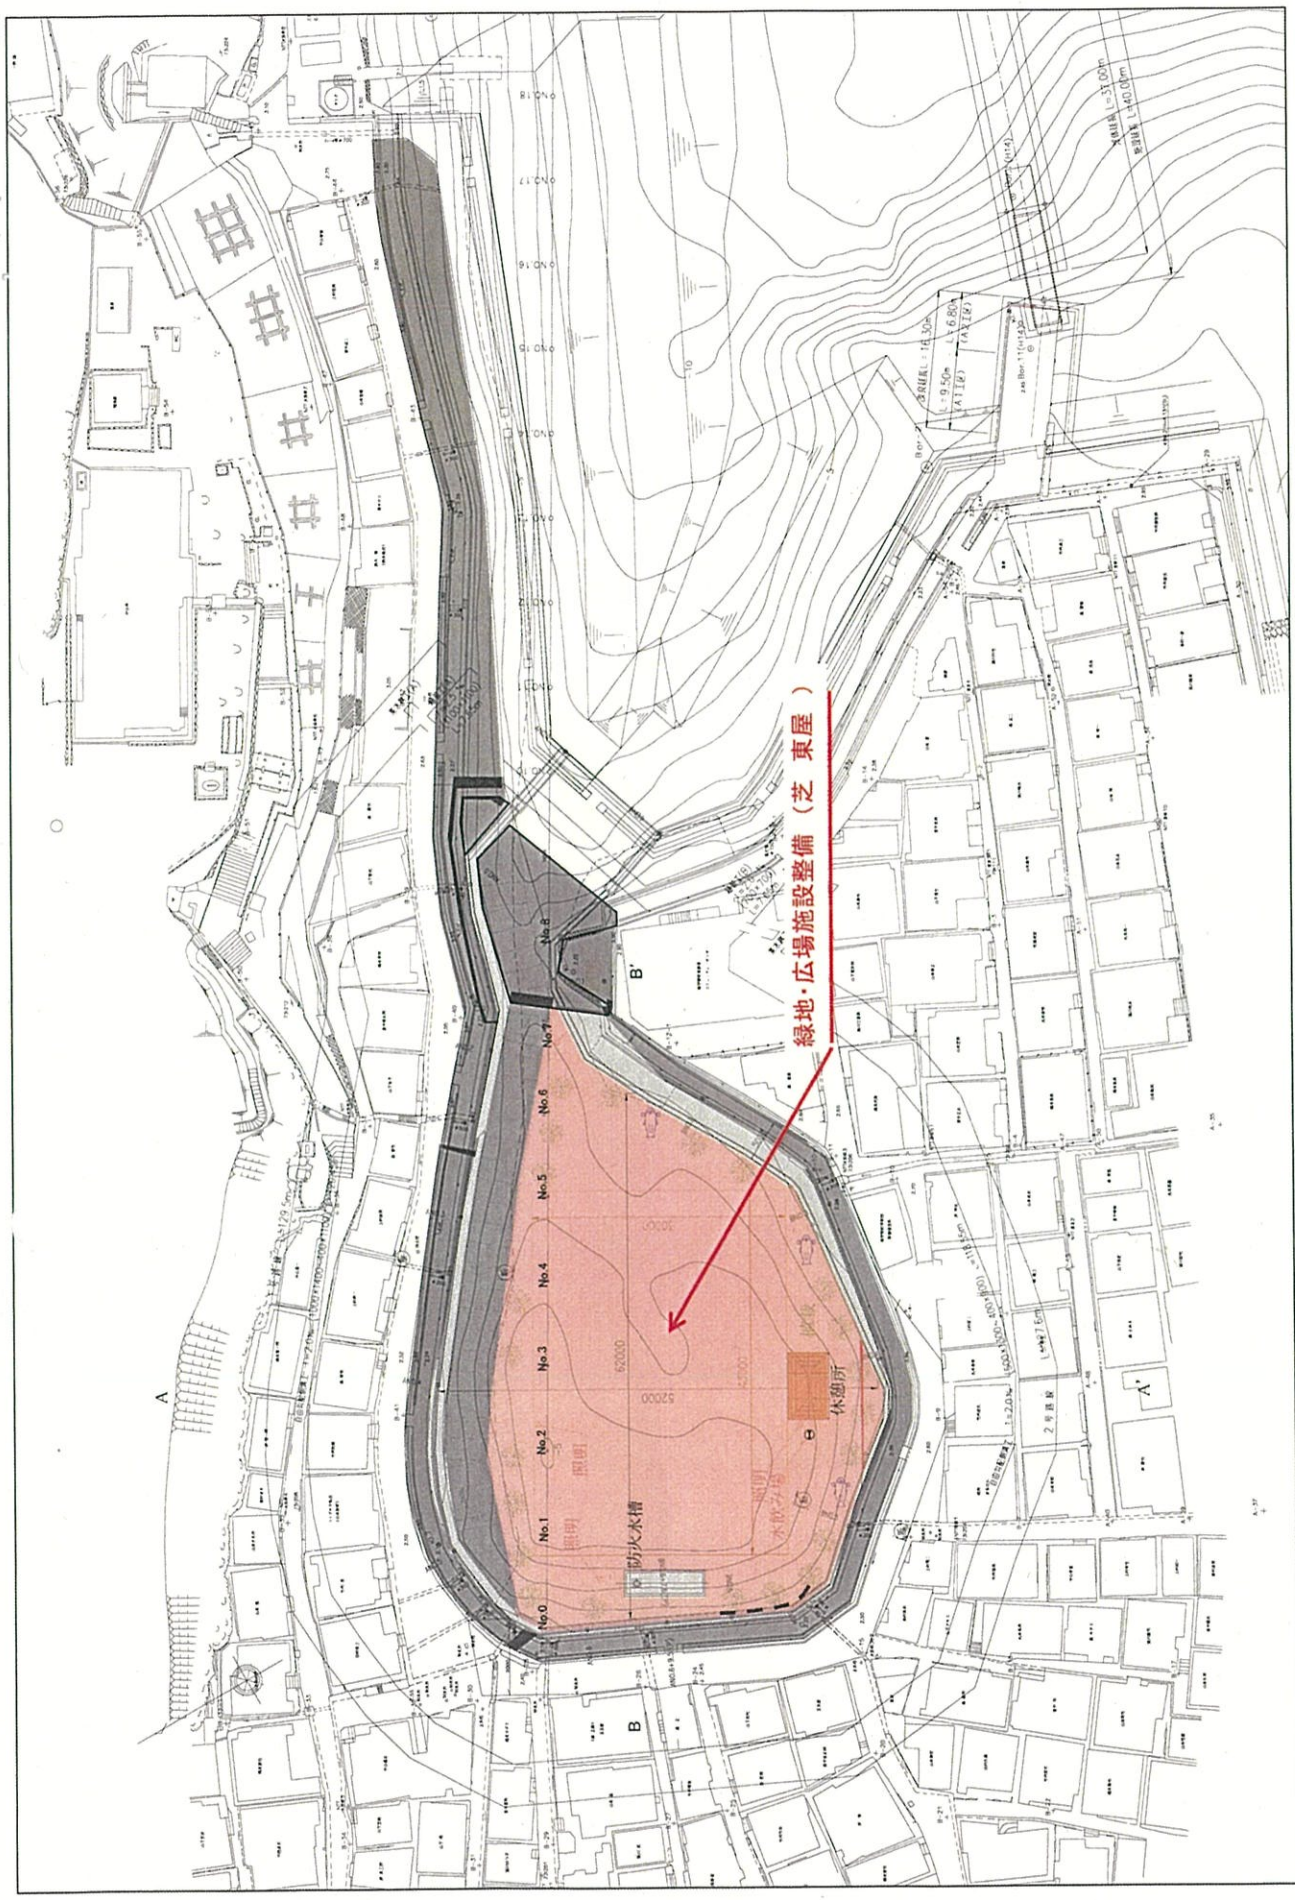

緑地・広場施設整備 (芝 東屋)
